



GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)

LPR-061



**GOBIERNO DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**(INSEP)**  
**DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS**  
**ORDEN DE CAMBIO No. 1**

**PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO LA CRUZ, HACIA HOTEL PALMIRA, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO."**

**CONTRATISTA: CORPORACION SOL S.A. DE C.V.**

**FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017**

De acuerdo al contrato del PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO LA CRUZ, HACIA HOTEL PALMIRA, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO."

Suscrito el 13 de Marzo de 2017 entre el Señor Secretario de Estado por Ley en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) Lic. Roberto Antonio Pineda y la señora María Daniela Chávez, en su condición de Gerente General de la Empresa CORPORACION SOL S.A. DE C.V. Se emite la siguiente Orden de Cambio No. 1 con base en las siguientes justificaciones:

**CONSIDERANDO:** Que este proyecto trae mejoras a la red vial del Municipio de Catacamas, además fuentes de empleo a los pobladores.

**CONSIDERANDO:** Debido a que el empedrado existente contaba con bordillo y este se encontraba en buen estado se decidió no demolerlo y así compensar esa actividad completando el pavimento de la calle, en compensación con la actividades de pavimento se decidió aumentar la cantidad a pavimentar y por ende aumentaron también las demás actividades.

**CONSIDERANDO:** Que la revisión de actividades permite un aumento en el cuadro de cantidades que corresponden al PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO LA CRUZ, HACIA HOTEL PALMIRA, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO." según contrato Original, en consecuencia, se modifican las cantidades de obra de la forma siguiente:





GOBIERNO DE HONDURAS





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)



**CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA (CONTRATO ORIGINAL).**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trazado y Marcado con Teodolito	GLOBAL	1.00	18,978.75	18,978.75
2	Demolición de Empedrado	M3	275.94	304.73	84,087.20
3	Excavación Tipo I (Material Común)	M3	450.00	181.13	81,508.50
4	Acarreo de Material de Desperdicio	M3-KM	3,167.00	22.54	71,384.18
5	Conformación de Sub Rasante	M2	1,500.00	92.75	139,125.00
6	Relleno Compactado con Material Selecto e=15 cm	M3	225.00	366.64	82,494.00
7	Losa de Concreto Hidráulico 4,000 PSI e=15cm Incluye Corte, Curado y Sellado	M3	225.00	5,580.90	1,255,702.50
8	Acero de Refuerzo, Grado Inter. Fy=2,800 kg/cm <sup>2</sup>	KG	526.00	96.30	50,653.80
9	Bordillo de Concreto (Incluye Pintura)	ML	398.00	388.01	154,427.98
10	Levantamiento de Pozos	UNIDAD	2.00	3,123.90	6,247.80
11	Movilización de Equipo	GLOBAL	1.00	45,006.10	45,006.10
12	Rotulo del Proyecto	UNIDAD	1.00	5,628.40	5,628.40
<b>TOTAL</b>					<b>1,995,244.21</b>





**CANTIDADES DE OBRA QUE SE INCREMENTAN.**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Demolición De Empedrado	M3	156.06	304.73	47,556.16
3	Excavación Tipo I (Material Común)	M3	296.31	181.13	53,670.63
4	Acarreo de Material de Desperdicio	M3-KM	6,259.48	22.54	141,088.68
5	Conformación de Subrasante	M2	106.66	92.75	9,892.72
6	Relleno Compactado con Material Selecto e=15cm	M3	16.00	366.64	5,866.24
7	Losa de Concreto Hidráulico 4,000 PSI, e=15cm Incluye Corte Curado y Sellado	M3	16.00	5,580.90	89,294.40
<b>TOTAL</b>					<b>347,368.83</b>

**CANTIDADES DE OBRA QUE SE DISMINUYEN.**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	Bordillo de Concreto (Incluye Pintura)	ML	-398.00	388.01	-154,427.98
10	Levantamiento de Pozos	UNIDAD	-1.00	3,123.90	-3,123.90
<b>TOTAL</b>					<b>157,551.88</b>

AGENCIADO  
JOSÉ M. HERNÁNDEZ  
ABOGADO EN LEY  
CIVIL  
12-12-93  
15-08-94  
19909 - C.I.F. N.º 10013





GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)





**RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA (ORDEN DE CAMBIO No. 1).**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trazado y Marcado con Teodolito	Global	1.00	18,978.75	18,978.75
2	Demolición De Empedrado	M3	432.00	304.73	131,643.36
3	Excavación Tipo I (Material Común)	M3	746.31	181.13	135,179.13
4	Acarreo de Material de Desperdicio	M3-KM	9,426.48	22.54	212,472.86
5	Conformación de Subrasante	M2	1,606.66	92.75	149,017.72
6	Relleno Compactado con Material Selecto e=15cm	M3	241.00	366.64	88,360.24
7	Losa de Concreto Hidráulico 4,000 PSI, e=15cm Incluye Corte Curado y Sellado	M3	241.00	5,580.90	1,344,996.90
8	Acero de Refuerzo, Grado Inter. Fy=2,800 kg/cm2	KG	526.00	96.30	50,653.80
9	Bordillo de Concreto (Incluye Pintura)	ML	0.00	388.01	0.00
10	Levantamiento de Pozos	UNIDAD	1.00	3,123.90	3,123.90
11	Rotulo del Proyecto	GLOBAL	1.00	5,628.40	5,628.40
12	Movilización de Equipo	UNIDAD	1.00	45,006.10	45,006.10
<b>TOTAL</b>					<b>2,185,061.16</b>

La presente Orden de Cambio No 1, se emite con base en lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Contratación del Estado. La presente Orden de Cambio incrementa en un **9.51%** del monto del Contrato Original, lo cual representan una cantidad de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 95/100. (L. 189,816.95)**, quedando el monto según Orden de Cambio No.1 en **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/100. (L. 2, 185,061.95)**.

El trabajo se ejecutara de acuerdo a lo establecido en el Contrato y con las especificaciones Técnicas requeridas, el pago se efectuara de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas; La presente Orden de Cambio no modificará el tiempo de ejecución contractual.





GOBIERNO DE HONDURAS





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)






Los abajo firmantes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de las estipulaciones y se obliga a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos la presente Orden de Cambio.

  
  
**CORPORACION SOL S.A. DE C.V.C.M.**  
 CONTRATISTA

  
  
**ING. JORGE RAFAEL CARTAGENA**  
 SUPERVISION

  
  
**ING. VILMA MARQUEZ**  
 Jefe Unidad Apoyo Técnico y Seguridad Vial  
 INSEP

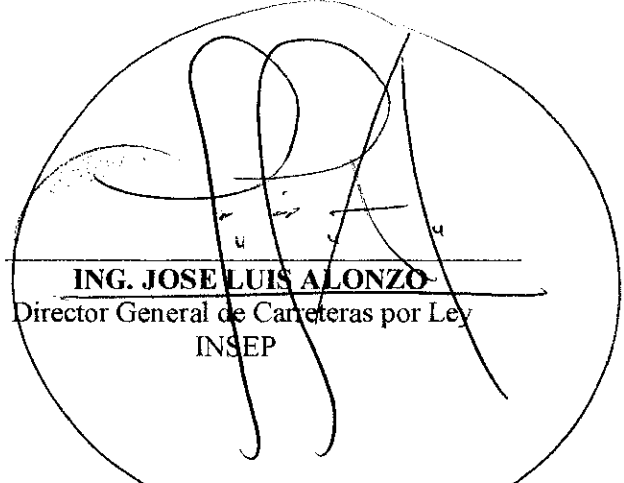  
**ING. JOSE LUIS ALONZO**  
 Director General de Carreteras por Ley  
 INSEP
